


# DIE ABBUNDPROFIS

## Checkliste 1 Holzrahmenbau: **Wir sind Abbund.**


Kunde:  BV:  Datum:   
 Montagereihenfolge:

### Traufdetail

Variante 1   
 mit Stellbrettnut   
 rechteckig   
 senklig   
 Putzleiste bauseits !!

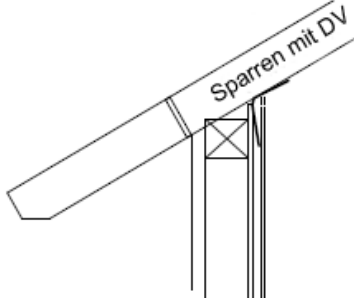


Variante 2

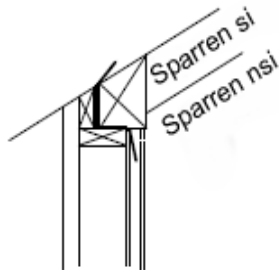

Anschluss SSV   
 Ausnutzung AZB


Variante 3

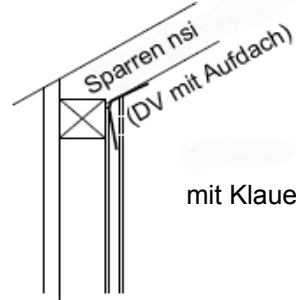

mit Klaue

### Deckenübergang

#### Deckenelement

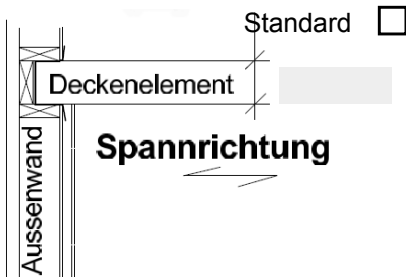

Standard

Spannrichtung



Quer zur Wand

Decke si   
 Decke nsi   
 Rampamuffen   
 Bearbeitungen an der Decke  
 =kleiner 62,5 u. Fremdfeder

doppel N&F  doppel N&F   
 oberseitige Abfalzung ohne oberseitige  
 bauseitiges Einlagebrett Abfalzung



einfach N&F  einfach N&F   
 oberseitige Abfalzung ohne oberseitige  
 bauseitiges Einlagebrett Abfalzung



#### si – Balkenlage sichtbar

Variante A



Balkenlage si  
 = Randholz

Anschluss SSV   
 Ausnutzung AZB

Zwischenwand = Stellbrettnut  
 Zwischenwand = Füllholz (breit)  
 Zwischenwand wird bauseitig  
 geschlossen

Variante B



Balkenlage si  
 = Stellbrettnut

#### nsi – Balkenlage nicht sichtbar



Balkenlage nsi

Balkenaufleger



Balkenlage nsi

Quer zur Wand

KVH   
 Bauholz A getr. m. Zumaß (+3mm)   
 Bauholz A getr. m. Zumaß (+3mm)   
 Bauholz S getr.+ geh. Mit Zumaß  
 (+10mm)   
 BSH nsi   
 BSH si   
 DUO nsi   
 DUO si

FFB im DG   
 FFB im OG   
 FFB im EG   
 Zimmertüren 2,01m von FFB   
 Zimmertüren 2,135m von FFB   
 Schiebetür mit Tasche  
 (Angabe notwendig)   
 Schiebetür als Vorbau
